

# **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA**

**VILLA TENIS**

**FASE 1**


**OUTUBRO 2024**

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA


outubro-24

Obra	Fase	Início	Término	Tempo decorrido
Villa Tennis Itapira	1	01/09/2023	31/05/2024	100,0%
Índice	Mês base	Valor base	Área construída	
INCC-M (N-1)	out-22	1.046,507	17.300,07 m <sup>2</sup>	
Orçamento em reais	R\$/m <sup>2</sup> construída	Orçamento em índice	índice/m <sup>2</sup> equiv.	
R\$ 6.198.676	358,3	5.923,21	0,34	

Físico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	período						0,0%	3,2%	12,5%	16,6%	18,5%	10,0%
	acumulado						0,0%	3,2%	15,7%	32,3%	50,8%	60,8%
	previsto						0,0%	2,0%	10,0%	22,0%	37,0%	52,0%
2024	período	4,5%	9,2%	8,8%	8,8%	7,4%	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	
	acumulado	65,3%	74,5%	83,3%	92,1%	99,5%	99,7%	99,7%	99,8%	99,8%	99,8%	
	previsto	64,0%	74,0%	83,0%	92,0%	100,0%						
2025	período											
	acumulado											
	previsto											

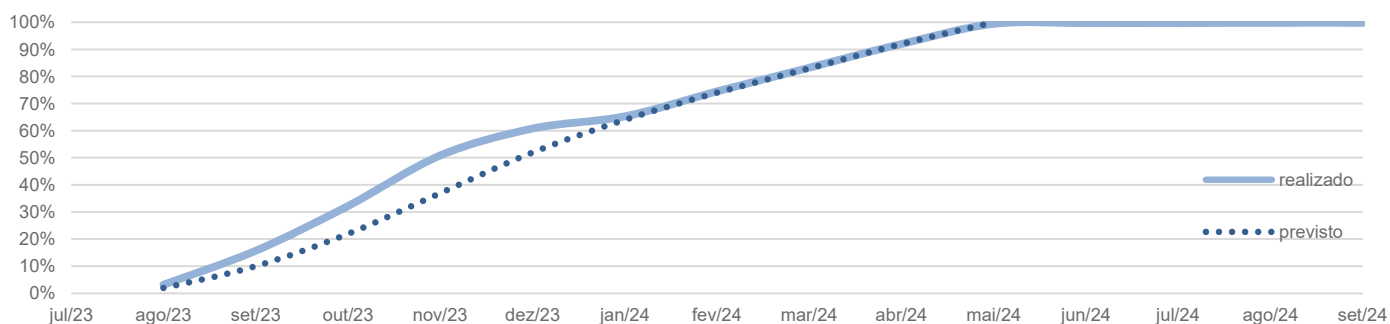

Financeiro	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	período						0,0%	2,1%	2,3%	3,3%	16,2%	25,0%
	acumulado						0,0%	2,1%	4,4%	7,7%	23,9%	48,9%
	previsto						2,0%	5,0%	10,0%	18,0%	28,0%	40,0%
2024	período	5,6%	10,5%	10,9%	6,1%	6,7%	5,5%	0,9%	0,3%	0,0%	0,0%	
	acumulado	54,5%	65,0%	75,8%	81,9%	88,6%	94,1%	95,0%	95,3%	95,3%	95,4%	
	previsto	52,0%	64,0%	79,0%	89,0%	96,0%	100,0%					
2025	período											
	acumulado											
	previsto											

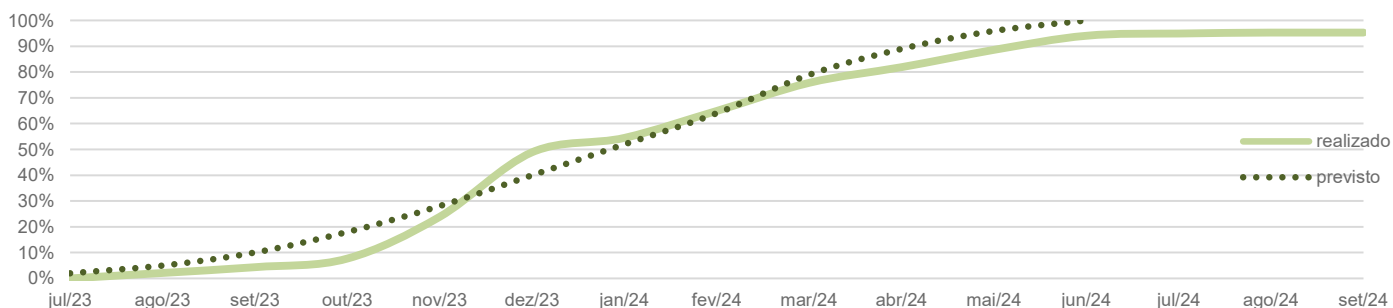

Resumo	em índice	em reais atualizados	índice
Orçamento	5.923	R\$ 6.731.847	Valor atual (n-1) 1.136,521
Tendência custo final	5.748	R\$ 6.532.599	Variação 8,60%
Tendência/m <sup>2</sup> equiv.	0,33	R\$ 378	
Comparação com orçado	175,31	R\$ 199.249	
Percentual do orçamento	3,0%		

# RELATÓRIO ANALÍTICO

Item	Etapa	O	A		Físico		B	C	D=A+B+C	E=D-O	F=E/O
		Orçamento	Financeiro acumulado	%	acumulado	%	Saldos de Contratados	Previsão de contratação	Tendência de custo da obra	Saldo	% do orçamento
<b>012</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	<b>1.021,8</b>	<b>877,6</b>	<b>85,9%</b>	<b>1.022</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>4,8</b>	<b>884,6</b>	<b>137,2</b>	<b>13,4%</b>
01.001	SEGUROS E TAXAS	66,8	42,8	64,1%	67	100,0%	0	0,0	42,8	24,0	35,9%
01.002	CONTROLE TECNOLÓGICO	25,4	41,2	162,0%	25	100,0%	0	0,0	41,2	-15,8	-62,0%
01.003	SERVIÇOS TÉCNICOS	14,6	7,6	51,9%	15	100,0%	0	0,0	7,6	7,0	48,1%
01.004	CANTEIRO OBRA	288,1	253,1	87,8%	288	100,0%	0	0,5	253,6	34,5	12,0%
01.005	OPERAÇÃO DO CANTEIRO	67,5	32,7	48,5%	67	100,0%	0	0,0	32,7	34,7	51,5%
01.006	EQUIPE DE OBRA	412,4	358,2	86,8%	412	100,0%	2	3,9	364,4	48,0	11,6%
01.007	EQUIPAMENTOS	93,5	113,2	121,1%	94	100,0%	0	0,2	113,5	-20,0	-21,4%
01.008	SEGURANÇA DO TRABALHO	53,5	28,7	53,8%	53	100,0%	0	0,0	28,8	24,7	46,1%
<b>03</b>	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>4.901,4</b>	<b>4.771,2</b>	<b>97,3%</b>	<b>4.892</b>	<b>99,8%</b>	<b>52</b>	<b>40,0</b>	<b>4.863,2</b>	<b>38,1</b>	<b>0,8%</b>
02.001	MOVIMENTO DE TERRA	430,7	224,6	52,1%	431	100,0%	0	0,6	225,2	205,5	47,7%
02.002	FUNDAÇÃO PROFUNDA	1.639,6	1.969,0	120,1%	1.640	100,0%	0	2,2	1.971,3	-331,7	-20,2%
02.003	BLOCOS E BALDRAMES	934,7	913,1	97,7%	935	100,0%	10	3,1	925,7	9,0	1,0%
02.004	CONTENÇÕES	314,6	262,3	83,4%	305	97,0%	20	35,4	317,4	-2,8	-0,9%
02.005	ESTRUTURA DE CONCRETO	1.454,5	1.362,1	93,6%	1.455	100,0%	23	-2,8	1.382,0	72,5	5,0%
02.006	PAINEIS E VEDAÇÕES	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.007	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.008	ESQUADRIAS DE FERRO	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.009	ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.010	COBERTURAS	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.011	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.012	REVESTIMENTOS FACHADA	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.013	REVESTIMENTOS CIMENTADOS	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.014	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.015	MÁRMORES E GRANITOS	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.016	GESSO E FORROS	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.017	PINTURA INTERNA	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.018	PINTURA EXTERNA	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.019	LIMPEZA DE OBRA	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.020	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	42,1	21,6	51,3%	42	100,0%	0	1,0	22,6	19,6	46,5%
02.021	METAIS E ACESSÓRIOS	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.022	LOUÇAS	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.023	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	63,2	18,5	29,3%	63	100,0%	0	0,5	19,1	44,1	69,8%
02.024	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.025	ELEVADOR	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.026	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.027	PAISAGISMO	-	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0	0,0%
02.028	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22,0	0,0	0,0%	22	100,0%	0	0,0	0,0	22,0	100,0%
<b>TOTAL</b>		<b>5.923,2</b>	<b>5.648,8</b>	<b>95,4%</b>	<b>5.913,8</b>	<b>99,8%</b>	<b>54,3</b>	<b>44,8</b>	<b>5.747,9</b>	<b>175,3</b>	<b>3,0%</b>
03.001	CUSTO NÃO OBRA		81,4	0,0%			20	15,6	116,5		

Valores em INCC-M

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VILLA TENIS



FOTO 1 – Laje garagem G1



FOTO 2 – Laje garagem G1



FOTO 3 – Laje garagem G1



FOTO 4 – Laje garagem G1
